



イラク復興支援群活動報告

17. 12. 31

イラク復興支援群

報告項目

- 1 全般
- 2 人員、装備の状況
- 3 現地の治安状況等
- 4 明日の活動予定

全 報 (17年12月31日)

- ◎ サマーワ主力
 - 人員・武器・装具、具状なし
 - 警備態勢：[REDACTED]
 - 人道復興支援関連
 - ◆ 医療
 - 外務省等との調整
 - ◆ 学校等の公共施設の復旧・整備
 - ・ 学校の改修：
 - アル・クワキブ小学校の施工状況確認（ワルカ）
別紙第1「アル・クワキブ小学校施工状況確認」
 - 12カ所（サマーワ×7、ワルカ、ヒラール、ヒドル×2、ルメイサ）での役務作業
 - ・ 道路の改修：
 - 3カ所（ルメイサ、スウェイル、ワルカ）での役務作業
 - ・ PHCの改修：
 - シャファPHCの施工状況確認（サマーワ）
別紙第1「シャファPHC施工状況確認」
 - 14カ所（サマーワ×5、ヒドル×2、マジット、ダラージ、ルメイサ×2、ワルカ×3）での役務作業
 - ・ 給水関連施設の改修：
 - 4カ所（サマーワ、ワルカ、ルメイサ×2）での役務作業
 - ・ 青年・女性・福祉関連施設の改修：
 - 2カ所（サマーワ×2）での役務作業
 - ・ 清掃事業関連施設の改修：
 - 1カ所（サマーワ）での役務作業
 - ・ 燃料関連施設の改修：
 - 1カ所（サマーワ）での役務作業

全 報 (17年12月31日)

- 行事等
 - ・ 年末年始行事（除夜太鼓）
別紙第2「除夜太鼓」
- 宿营地関連施設の整備
 - ・ 宿营地散水
 - ・ ゴミ回収
 - ・ 糞尿くみ取り
 - ・ 環境維持作業
 - ・ 冷凍、冷蔵コンテナメンテナンス
 - ・ コンテナ整備（本邦後送品準備）
 - ・ 映像伝送予行
 - ・ コンテナスキャナ整備
 - ・ 警衛所待避所耐弾化工事
 - ・ 耐弾作業所増設
 - ・ 運河取水点偵察
 - ・ 年末年始行事舞台撤収作業
 - ・ ゴミ消却場整備作業
 - ・ 宿营地内防疫（各ゲート及びトイレ等）
- 12月31日現在の雇用人員
計773名（累計：376,252名） 細部別表「雇用者」参照
- その他（特記事項）
 - ・ 警備中隊が宿营地内において自隊訓練を実施（[REDACTED]訓練）
 - ・ 対外発信関連：12月号原稿調整（宿营地）
 - ・ 供与RO浄水機による配水なし（RO付帯設備施工のため当分の間、配水休止）
12月31日まで計約50,359t（約11,168,663人分）配水（4.5リットル/人・日換算）

全 般 (17年12月31日)


- ◎ クウェート分遣班
 - ・ 統一整備日
- ◎ バクダッドLO
 - ・ 情報収集及び情報資料の送付等
- ◎ バスラLO
 - ・ 情報要求対応及び定例情報収集
 - ・ 定例会議への参加
 - ・ 空路輸送調整
- ◎ スミッティLO
 - ・ 情報要求対応等
 - ・ 各種業務調整等
 - ・ 各種ミーティング等
- ◎ クウェート大使館LO
 - ・ 連絡調整
 - ・ 情報収集

雇 用 者 (17年12月31日)

別表


区分	人員数(名)	小計(名)	合計(名)	
宿営地外役務	医療	296	592	773
	学校修復	142		
	道路補修	32		
	青年・スポーツ関連	62		
	清掃事業関連	0		
	給水関連	44		
	燃料	16		
宿営地内役務	通訳	62	181	
	警備	40		
	給仕	1		
	ゴミ処理	3		
	し尿処理	3		
	清掃	3		
	エンジニア	2		
	タクシー	26		
	床屋	2		
	弁護士	2		
アドバイザー	1			
電気工等	3			
調査員	8			
耐弾性強化施設補修	20			
コンテナメンテナンス	5			

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(17年12月31日成果/学校)



アルカホフ小学校(ワルカ) (10/17~1月下旬) 活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 25名/日雇用 活動状況 完成点検終了、追加契約の工事実施中	サナフ小学校(ルカサ) (12/24~2月下旬) 新規事業(図標:NV191882) 活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 25名/日雇用
セイサー中学校(ヘラル) (4/20~7月下旬) (施工遅延) 活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 20名/日雇用 活動状況 完成点検終了、追加契約の工事実施中	サルジューン小学校(サマー) (6/20~8月下旬) (施工遅延) 活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用 活動状況 竣工式待ち
TM7スマ(小学校(分校))(サマー) (12/18~3月下旬) 活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 15名/日雇用	アルミサック中学校(サマー) (4/2~8月中旬) (施工遅延) 活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 30名/日雇用
サマー看護学校(サマー) (6/17~9月下旬) (施工遅延) 活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 20名/日雇用	コルバ小学校(ピル) (7/6~11月上旬) (施工遅延) 活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用 活動状況 竣工式待ち
ブレート小学校(サマー) (4/25~7月下旬) (施工遅延) 活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用 活動状況 完成点検終了(手直し中)、追加契約予定	アル・ホルト小学校(サマー) 活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 6名/日雇用
	アル・ホルト小学校分校(サマー) (7/8~10月上旬) (施工遅延) 活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 2名/日雇用 活動状況 完成点検終了(手直しの指示待ち)
	アル・ブーフ小学校(ピル) (12/28~2月下旬) 活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(17年12月31日成果/道路、給水関連施設)

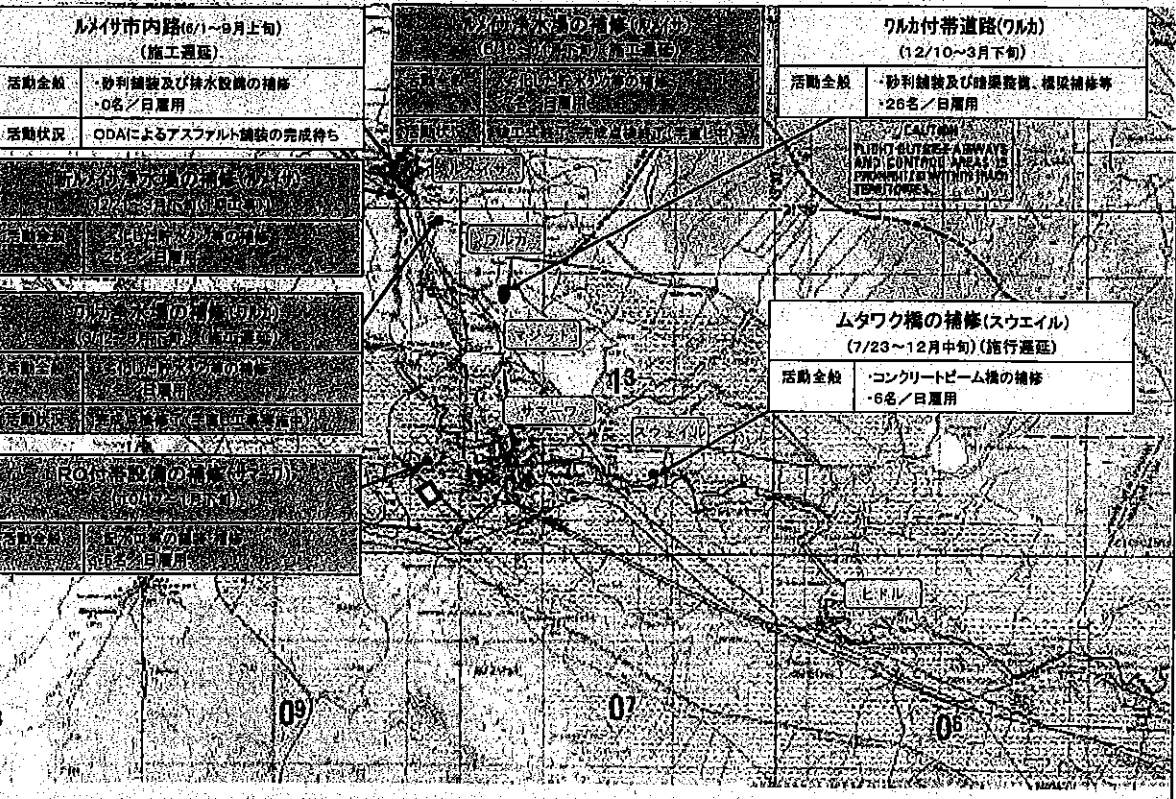

ルメイ市内路(6/1~9月上旬) (施工遅延) 活動全般 砂利舗装及び排水設備の補修 0名/日雇用 活動状況 ODAIによるアスファルト舗装の完成待ち	ワルカ付帯道路(ワルカ) (12/10~3月下旬) 活動全般 砂利舗装及び給排水設備、橋梁補修等 28名/日雇用
ワルカ付帯道路の補修(ワルカ) (6/15~9月上旬) 活動全般 砂利舗装及び給排水設備の補修 0名/日雇用 活動状況 完成点検終了(手直し中)	ムタワク橋の補修(スウエイル) (7/23~12月中旬)(施工遅延) 活動全般 コンクリートビーム橋の補修 6名/日雇用
ワルカ付帯道路の補修(ワルカ) (6/15~9月上旬) 活動全般 砂利舗装及び給排水設備の補修 0名/日雇用 活動状況 完成点検終了(手直し中)	
ワルカ付帯道路の補修(ワルカ) (6/15~9月上旬) 活動全般 砂利舗装及び給排水設備の補修 0名/日雇用 活動状況 完成点検終了(手直し中)	
ワルカ付帯道路の補修(ワルカ) (6/15~9月上旬) 活動全般 砂利舗装及び給排水設備の補修 0名/日雇用 活動状況 完成点検終了(手直し中)	

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(17年12月31日成果/PHC)

<p>05</p> <p>0751PHC補修(0751)(6/24~30月下旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 15名/日雇用</p>		<p>0761PHC補修(0761)(7/30~12月上旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 60名/日雇用</p>
<p>0752PHC補修(0752)(6/22~7月中旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 30名/日雇用</p>		<p>0762PHC補修(0762)(7/12~10月中旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 10名/日雇用</p>
<p>07520PHC補修(07520)(7/25~12月上旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 18名/日雇用</p>		<p>0763PHC補修(0763)(6/5~11月中旬) (施工遅延)(完成済後中)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 22名/日雇用</p>
<p>077PHC補修(077)(6/17~7月上旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 2名/日雇用</p>		<p>0764PHC補修(0764)(6/16~7月上旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 30名/日雇用</p>
<p>0770PHC補修(0770)(6/16~6月中旬) (施工遅延)(竣工済後)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 0名/日雇用</p>		<p>0765PHC補修(0765)(7/14~10月下旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 8名/日雇用</p>
<p>0771PHC補修(0771)(6/17~7月上旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 27名/日雇用</p>		<p>0766PHC補修(0766)(10/6~11月上旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 10名/日雇用</p>
<p>077PHC補修(077)(10/26~11月上旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 12名/日雇用</p>		<p>0767PHC補修(0767)(6/20~8月下旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 0名/日雇用</p>
		<p>0768PHC補修(0768)(10/6~11月上旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 0名/日雇用</p>
		<p>0769PHC補修(0769)(10/6~11月上旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 0名/日雇用</p>
		<p>0770PHC補修(0770)(10/26~11月上旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 0名/日雇用</p>
		<p>0771PHC補修(0771)(10/26~11月上旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 0名/日雇用</p>
		<p>0772PHC補修(0772)(10/26~11月上旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 0名/日雇用</p>
		<p>0773PHC補修(0773)(10/26~11月上旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 0名/日雇用</p>
		<p>0774PHC補修(0774)(10/26~11月上旬)</p> <p>活動全般 陸自電気配線の補修等 0名/日雇用</p>

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(17年12月31日成果/青年・女性・福祉・清掃事業等)

	<p>05</p>	<p>07</p>
	<p>06</p>	<p>08</p>
	<p>09</p>	<p>06</p>
	<p>09</p>	<p>06</p>
<p>市民生局カーン補修(サマー7)(1/2~7月下旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 建物・設備等関係の補修 0名/日雇用</p> <p>施工状況 竣工式終了(手直し点検待ち)</p>	<p>05</p> <p>CAUTION FLIGHT OUTERS ALWAYS AND CONTINUOUSLY IS PROHIBITED WITH INAC TERRITORIES</p> <p>07</p> <p>08</p>	<p>05</p> <p>07</p> <p>08</p>
<p>09</p>	<p>06</p>	<p>06</p>

上段:増人員数
下段:減人員数

人員現況

12月31日(土)

区分	所属人員	サマーワ			クウェート			バグダット			バスラ			キャンプ・スミッティ			国外			国内			(備考) 総員の変化及び 増減人員の変化
		定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	
8次支援群	481	481	0 0	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481	-	-	-	
8次警務派遣隊	10	10	0 0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	
4次業支援	111	78	0 0	76	25	0 0	25	5	0 0	5	4	0 0	4	1	0 0	1	-	-	111	-	-	-	
合計	802	587	0 0	567	25	0 0	25	5	0 0	5	4	0 0	4	1	0 0	1	-	-	802	-	-	-	

※ クウェートにはクウェート大使館LO1名を含む

本日のTV電話使用者数:0名、FOMA使用者数:50名(第8次群TV電話合計:69名、FOMA合計:1706名)

装備の現況 (車両等)

		車 両																	計		
		小型	中型	救急	軽甲	高機	WAPC	業4	マイクロ	施設	水タンク車	燃料タンク	冷凍車	セミトレ	大型	特大	浄水セット	重レッカ		溶接車	修理車
IQ	サマーワ	13	10	2	46	19	6		1	22	7	5	4	4	29	9	4	2	1	2	186
	シャイバ																				
	バスラ					1															1
	タリル																				
	バクダット																				
	計	13	10	2	46	20	6		1	22	7	5	4	4	29	9	4	2	1	2	187
KW	キャンプVA	1			6	1	1	2	1						8						20
	キャンプアリアジャン																				
	計	1			6	1	1	2	1						8						20
総計	14	10	2	52	21	7	2	2	22	7	5	4	4	37	9	4	2	1	2	207	


装備の現況（武器）

		武器						
		拳銃	89小銃	64小銃	MINIMI	12.7mm重機関銃	84RR	信号拳銃
I Q	サマフ							
	シャイバ							
	バズラ							
	タリル							
	バクダット							
	計							
K W	キャンプVA							
	キャンプアリアジャン							
	計							
総 計								

装備品等の可動・不可動の状況①

項 目	総 数	可 動	不 可 動	未 使 用	不可動の内容	備 考
車 両	207	205	1	1	冷凍冷蔵車×1 エンジン不良	未使用:WAPC×1(CV) 部品待×1
酷暑用冷凍冷蔵庫	8	5	0	3		
コンテナスキャナー	2	1	0	1		
エアコン	657	634	0	23		
発動発電機(6kw)	95	22	27	46	レギュレータ等不良×23 オイルセンサー不良×4	部品待×27
発動発電機(25kw)	67	40	16	11	ガバナ等不良×14 回転ケーブル不良×1 ノズル不良×1	部品待×16
発動発電機(60kw)	59	48	3	8	燃料噴射ポンプ×2 ピストン不良×1	部品待×3
発動発電機(180kw)	17	15	1	1	ガスケット損傷×1	部品待×1
遠距離大量送水システム	5	4	1	0	定期整備×1	後送中×1(オランダ)

事案等の発生状況 (30日0700~31日0700)

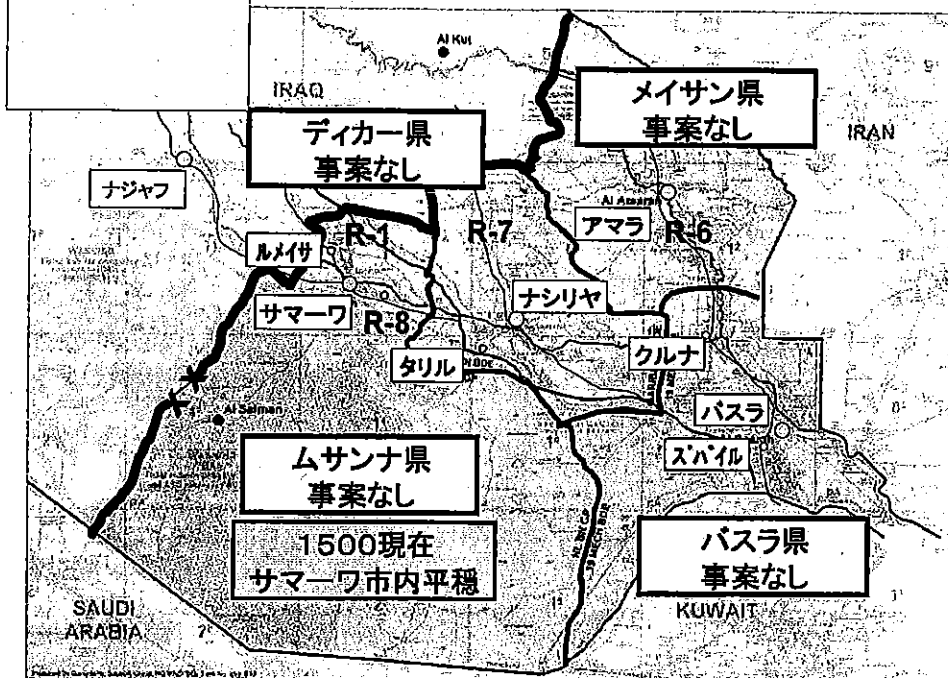

サドル派によるデモ(12.31)関連情報-1

【サドル派民兵等によるデモ関連の情報】(30日)

○サマーワ市内・バーター通りのコーヒーショップで4名(サドル派民兵メンバー×3名、サドル師支持者×1名)が会話。

- サドル派は、30日朝に予定していたデモを延期。
- 現在行なわれている交渉においてサドル派の要求が通らなければ、31日1000からコルネッシュ通りにおいてデモを実施。
- サドル派の要求は
 - ・多国籍軍の車列がサマーワ市内に入ることを拒否。
 - ・多国籍軍の車列が再度サドル派事務所に接近することを拒否。

【サドル派のデモ関連ピラ】(30日)

○本日、マーケットエリアの壁にサドル派のデモに関するピラを確認。

- 31日1000から、コルネッシュ通りでデモを実施。
- 内容は、「反占領軍」、「555・ジャファリ首相支持」

【サドル派の要求】

○県評議会元議長のマズーク議員が手榴弾事案に関する県評議会の審議(28日)において発言。

- 同議員は手榴弾事案後、サドル派のデモ参加者やガラウィ師に面会。
- ガラウィ師は2発の爆弾でザルガニ師を殺害しようとしたとして英軍を厳しく非難し、サドル派事務所として2つの要求を同議員に伝達。

サドル派によるデモ(12.31)関連情報-2



- サドル派の要求は
 - ・英軍からの謝罪
 - ・治安権限の英軍からイラク治安部隊への委譲

【28日に予定されていたサドル派のパレード】(29日)

○28日にサマーワ等においてサドル派民兵がパレードを行なうとの情報があったが、サマーワ、ナジャフにおいて群集やパレードは確認されなかった。

○28日にデモや群集が見られなかったことは、将来又は他地域における発生の可能性を否定するものではない。


<評価>

○31日にサマーワ市内においてサドル派がデモを行なう可能性がある。

○手榴弾事案後、サドル師から多国籍軍に対する暴力行為を抑えるよう指示が出されているとみられ、サドル派のデモは多国籍軍に対する非難アピール等に留まり、暴力行為は行なわれないのではないと思われる。

ただし、武器を携行して参加する者がいる可能性もあり、市内における多国籍軍車両の目撃等がきっかけとなって暴徒化する可能性も否定はできず注意を要する。

イラク全土の全般情勢評価(12.31)



(12月18日以降変化なし)

区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> ●バグダッド中心に中北・西部において多国籍軍及びイラク治安部隊に対する攻撃継続 ●政治プロセスに関連し、テロ、衝突等が発生する可能性 ●南東部でサドル派が活動を活発化させている可能性 	8/26追加 8/8追加
スンニ派過激派	<ul style="list-style-type: none"> ●当面は現在のレベルでの活動(反多国籍軍・イラク治安機関・移行政府)を継続(急激な過激化への兆候はなし) ●アンサル・スンナとザルカウィGpが共闘の可能性 ●ザルカウィ関連Gpの活動が活発化 ●シーア・スンニ宗派間対立を企図したテロ発生の可能性 	9/15追加 9/1追加
FRE	<ul style="list-style-type: none"> ●「反占領」を主眼に今後も脅威であり続ける 	
国際テロリスト	<ul style="list-style-type: none"> ●暴力と恐怖による方法(テロ)は今後も継続 	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ●民心の掌握(ソフト路線)継続。一方で民兵再構築実施 ●選挙後、サドル派民兵が暴力行為を活発化させる可能性 	12/15修正
特異事項	<ul style="list-style-type: none"> ●宗教行事等多数の人が集まる場を狙ったテロ(パニック誘引) 	9/1追加

イラク南東部の全般情勢評価 (12.31)



(12月15日以降変化なし)

区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> ●比較的安定→アマラ、バスラで多国籍軍・イラク治安部隊等への攻撃発生 ●メイサン県に存在すると考えられていた即製爆弾攻撃ネットワークがバスラ県に活動を拡大した可能性 ●バスラの不安定な治安情勢が継続する可能性 	8/17追加 9/27追加 9/20追加
スンニ過激派 国際テロリスト FRE	<ul style="list-style-type: none"> ●多国籍軍が駐留する限り攻撃は継続 ●バスラ・メイサン県で即製爆弾増加傾向 	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ●サドル師の指示に従わない一部勢力の存在 ●選挙後、サドル派民兵が暴力行為を活発化させる可能性 	8/28追加 12/15修正
MSR・ASR	<ul style="list-style-type: none"> ●即製爆弾・車両爆弾、友軍相撃、ロードスパイク、子供飛出しカージャックがMSRタンパ、ASRサークル上で発生 ●移動中のコンボイに対する車両爆弾の可能性 	7/23追加 7/22追加
タリルAB	<ul style="list-style-type: none"> ●空港への曲射撃及び離発着航空機に対する攻撃に警戒 	9/30追加
トレンド	南東部における電波指令式即製爆弾が増加	

ムサンナ県の全般情勢評価 (12.31)



(12月21日以降変化なし)

区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> ●比較的安定、しかしながら油断は出来ず ●知事、前評議会議長の動向等、政治情勢は依然流動的 ●イラク治安部隊の治安維持能力が向上しつつある。 	9/30修正 10/9追加
スンニ過激派 国際テロリスト	<ul style="list-style-type: none"> ●スンニ派テロリスト等が活動する可能性は低い、県外からの流入、他地域での活動のための存在あり 	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ●サドル師の統制に従わない一部のはねっかえり等が選挙後、暴力的活動を活発化させる可能性 ●サドル派民兵のはねっかえりが宿営地に対する曲射攻撃などの反多国籍軍行動をとる可能性(12月12日、サマーワ宿営地に対する曲射攻撃がEENT(1754)直後に発生) ●サマーワ市街において昼間に英軍巡察に対する小火器射撃が発生(11月21日:小火器射撃、12月21日:手榴弾攻撃) ●ルメイサ市において陸自部隊に対する抗議行動が発生 	12/15修正 12/13一部追加 11/22追加 12/21追加 12/6追加
部族関連	<ul style="list-style-type: none"> ●宿営地警備等の雇用の増大を企図する一部の部族関係者が存在するとの情報 	7/7追加
デモ関連	<ul style="list-style-type: none"> ●ムサンナ県の政治情勢は依然流動的であること、雇用問題、燃料値上げ等により民衆の不満が高まる可能性があることから、デモ発生の可能性は依然存続。 	12/20修正
