

~~秘密~~

イラク復興支援群活動報告

17.10.9

イラク復興支援群

報告項目

- 1 全般
- 2 人員、装備の状況
- 3 現地の治安状況等
- 4 明日の活動予定

全 般 (10月9日)

- ◎ サマーワ主力
 - 人員・武器・装具・異状なし
 - 警備態勢：[REDACTED]
 - 人道復興支援関連
 - ◆ 医療
 - サマーワ母子病院技術指導を実施 (サマーワ)
 - 別紙第1「サマーワ母子病院技術指導」
 - 外務省等との調整
 - ◆ 学校等の公共施設の復旧・整備
 - ・ 学校の改修：
 - アル・アスマイ小学校 (分校) の現地偵察を実施 (サマーワ)
 - 別紙第1「アル・アスマイ小学校 (分校) 現地偵察」
 - 11カ所 (サマーワ×7、ワルカ、ルメイサ、ヒラール、ヒドル) での役務作業
 - ・ 道路の改修：
 - ムタワク橋の施工状況確認を実施 (スウェイル)
 - 別紙第2「ムタワク橋施工状況確認」
 - 4カ所 (サマーワ×2、ルメイサ、スウェイル) での役務作業
 - ・ PHCの改修：
 - 11カ所 (サマーワ×2、ヒドル×2、マジット×2、ダラージ、ルメイサ、ワルカ×3) での役務作業
 - ・ 給水関連施設の改修：
 - 2カ所 (ワルカ、ルメイサ) での役務作業
 - ・ 青年・女性・福祉関連施設の改修：
 - 3カ所 (サマーワ×2、ルメイサ) での役務作業
 - ・ 清掃事業関連施設の改修：
 - 1カ所 (サマーワ) での役務作業

全 般 (10月9日)

- 行事等
 - ・ MND (SE) POLAD会議に [REDACTED] が参加 (バスラ)
- 宿営地関連施設の整備
 - ・ 冷凍コンテナメンテナンス
 - ・ 第1回現況調査 (~13日)
 - ・ 厚生施設内装改修
 - ・ 発電機再配置
 - ・ 宿営地内側溝整備
 - ・ スカッドバンカー設置
 - ・ コンテナ土壌排出作業
 - ・ [REDACTED] 通信ラックの設置・試験
 - ・ システム整備
- 10月9日現在の雇用人員
 - 計697名 (累計：319,291名) 細部別表「雇用者」参照
- その他 (特記事項)
 - ・ メンタルヘルス教育を受講中 (陸幕等出張者による)
 - ・ 業支隊長、戦力回復のためイラク出国 (12日まで：UAE (Fバイ) 滞在予定)
 - ・ 対外発信関連：10月号原稿調整 (宿営地)
 - ・ 供与RO浄水機により給水車延べ17両に対し約196t (約43,556人分) が配水された。
 - 10月9日まで計約45,671t (約10,149,111人分) 配水 (4.5t/M/人・日換算)
- ◎ クウェート分遣班
 - ・ クールダウン関連施設調査
 - ・ CV宿泊施設調整
- ◎ バクダッドL.O
 - ・ 情報収集
 - ・ 情報資料の送付

全 般 (10月9日)

- ◎ バスラロ
 - ・情報要求対応及び定例情報収集
 - ・定例会議への参加
 - ・空路輸送調整
- ◎ スミッティロ
 - ・情報要求対応等
 - ・各種乗務調整等(10日、群長等のCPスミッティ訪問)
 - ・各種ミーティング等
- ◎ クウェート大使館LO
 - ・連絡調整：来訪者調整
 - ・情報収集：公電等

別表

雇 用 者 (10月9日)

区分		人員数(名)	小計(名)	合計(名)
宿営地外役務	医療	182	519	697
	学校修復	232		
	道路補修	8		
	青年・スポーツ関連	40		
	清掃事業関連	7		
	給水関連	72		
宿営地内役務	通訳	60	178	
	整備	40		
	給仕	1		
	ゴミ処理	5		
	し尿処理	5		
	清掃	3		
	エンジニア	2		
	タクシー	28		
	床屋	2		
	弁護士	1		
	アドバイザー	1		
	電気工等	3		
	調査員	7		
耐震性強化施設補修	20			

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(10月9日成果/学校)

7人7人男子小学校 7人7人女子小学校(7/17)(4/16~7月下旬) (施工遅延)		7人7人小学校(7/6)(4/11~6月中旬) (施工遅延)
活動全数 ・砂利舗装、電気配線の補修等 ・0名/日雇用		活動全数 ・砂利舗装、電気配線の補修等 ・7名/日雇用
施工状況 完成点検終了(予定中止)		施工状況 完成点検終了(一部資材搬入済)
スリム中学校(ヒール)(4/20~7月下旬) (施工遅延)		サルヴェン小学校(サマー)(6/20~9月中旬) (施工遅延)
活動全数 ・砂利舗装、電気配線の補修等 ・0名/日雇用		活動全数 ・砂利舗装、電気配線の補修等 ・15名/日雇用
7人7人小学校(サマー)		サマー工業高校(サマー)(6/7~9月中旬) (施工遅延)
活動全数 ・砂利舗装、電気配線の補修等 ・0名/日雇用		活動全数 ・砂利舗装、電気配線の補修等 ・35名/日雇用
施工状況 工事内容完了(完成点検待機中) 学園工事完了		7人7人中学校(サマー)(4/2~9月中旬) (施工遅延)
7人7人小学校(サマー)(7/6~11月上旬)		活動全数 ・砂利舗装、電気配線の補修等 ・40名/日雇用
7人7人小学校(サマー)(7/6~10月上旬) (施工遅延)		7人7人小学校(サマー)(6/17~9月中旬) (施工遅延)
活動全数 ・砂利舗装、電気配線の補修等 ・15名/日雇用	活動全数 ・砂利舗装、電気配線の補修等 ・40名/日雇用	
7人7人小学校(サマー)(4/2~7月下旬) (施工遅延)	サマー市道(サマー)(6/17~9月中旬) (施工遅延)	
活動全数 ・砂利舗装、電気配線の補修等 ・0名/日雇用	活動全数 ・砂利舗装、電気配線の補修等 ・40名/日雇用	

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(10月9日成果/道路(水開通施設))

ムナイ市内道(6/1~9月上旬) (施工遅延)		7人7人小学校(7/6)(4/11~6月中旬) (施工遅延)
活動全数 ・砂利舗装及び排水設備の補修 ・0名/日雇用		活動全数 ・砂利舗装、電気配線の補修等 ・7名/日雇用
施工状況 取崩のため		施工状況 完成点検終了(一部資材搬入済)
ムナイ市内道の補修(スウェイル) (7/29~12月中旬)		ムナイ市内道の補修(スウェイル) (7/29~12月中旬)
活動全数 ・コンクリートビーム橋の補修 ・0名/日雇用		活動全数 ・コンクリートビーム橋の補修 ・0名/日雇用
サマー市内道(アッサダール) (施工遅延)		サマー市内道(アッサダール) (施工遅延)
活動全数 ・砂利舗装及びアスファルト舗装 ・0名/日雇用		活動全数 ・砂利舗装及びアスファルト舗装 ・0名/日雇用
サマー市内道(アッサダール) (施工遅延)		サマー市内道(アッサダール) (施工遅延)
活動全数 ・砂利舗装及びアスファルト舗装 ・0名/日雇用		活動全数 ・砂利舗装及びアスファルト舗装 ・0名/日雇用
サマー市内道(アッサダール) (施工遅延)		サマー市内道(アッサダール) (施工遅延)
活動全数 ・砂利舗装及びアスファルト舗装 ・0名/日雇用	活動全数 ・砂利舗装及びアスファルト舗装 ・0名/日雇用	

上段:増人員数
下段:減人員数

人員現況

区分	所属人員	サマーワ		クウェート		バクダット		バスラ		キングスバレー		ドバイ		国外		国内		備考 (備考) 増減の变化及び 増減人員の变化	
		定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員		
7次支援班	481	481	0	480	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	481	-	-	
7次警備班	10	10	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	
4次支援班	111	78	0	70	25	0	20	8	0	4	4	0	1	0	111	-	-		
合計	602	647	0	660	25	0	20	8	0	4	4	0	1	0	602	-	-		

※ クウェートにはクウェート大使館LO1名を含む
本日のTV電話使用者数:0名、FOMA使用者数:29名(第7次群TV電話合計:60名、FOMA合計:1956名)

装備の現況 (車両等)

		車 両																計			
		小型	中型	救急	軽甲	高機	WAPC	業4	マイク口	施設	水タンク車	燃料タンク	冷凍車	セミトレ	大型	特大型	浄水セット		重レッカ	溶接車	修理車
IQ	サマーワ	13	10	2	43	19	6	1	22	7	5	4	4	29	9	4	2	1	2	183	
	シャイバ																				
	バスラ					1															1
	タリル																				
	バクダット																				
	計	13	10	2	43	20	6	1	22	7	5	4	4	29	9	4	2	1	2	184	
KW	キョフVA	1			3	1		2	1					8							16
	キョフアリオン																				
	計	1			3	1		2	1					8							16
	総計	14	10	2	46	21	6	2	22	7	5	4	4	37	9	4	2	1	2	200	

装備の現況（武器）

		武 器						
		拳銃	89小銃	64小銃	MINIMI	12.7mm重機関銃	84RR	信号拳銃
I Q	サマーワ							
	シャイバ							
	バスタ							
	タリル							
	バクダット							
	計							
K W	キャンブVA							
	キャンブアリフジヤン							
	計							
総 計								


装備品等の可動・不可動の状況①


項 目	総 数	可 動	不 可 動	未 使 用	不可動の内容	備 考
車 両	201	200	1	0	WAPC×1 底板亀裂	後送中×1(本邦)
陸軍用冷凍冷蔵庫	8	2	2	4	発電機コンプレッサ冷媒漏れ×1 発電機コンプレッサ動作不良×1	後送中(クウェート)
コンテナスキャナー	2	1	0	1	定期整備完了に伴う受け入れ	
エアコン	657	634	0	23		
発電発電機(6kw)	95	36	14	45	レギュレータ等不良×14	部品待×14
発電発電機(25kw)	67	44	11	12	ガバナ等不良×10 回転ケーブル不良×1	部品待×11
発電発電機(60kw)	59	47	0	12		
発電発電機(180kw)	17	15	0	2		
ロードローラ	1	1	0	0	オイルクーラ亀裂	部品待(応急修理完了)
遠距離大量送水システム	5	4	1	0	エンジン不良	後送中(クウェート)

装備品等の可動・不可動の状況②

項 目		総 数	可 動	不 可 動	未 使 用	不可動の内容	備 考
浄水セット	官品	4	4	0	0		
	民生	2	2	0	0		
遠距離監視システム	昼用						
	夜用						
近距離監視システム							
近距離暗視装置(V7)							
微光暗視装置(V3)							
空中監視装置							

全国の事案等の発生状況(昨日)

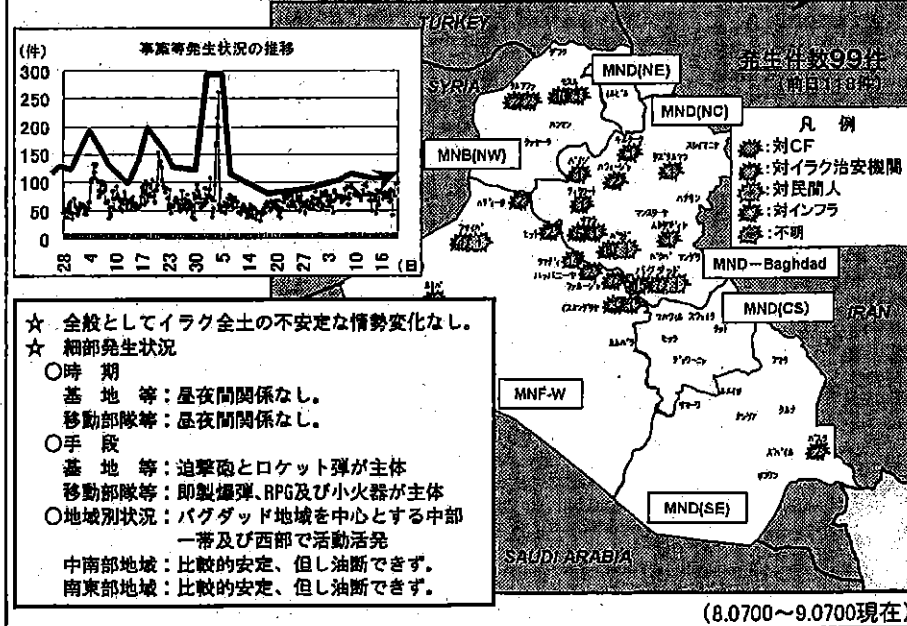

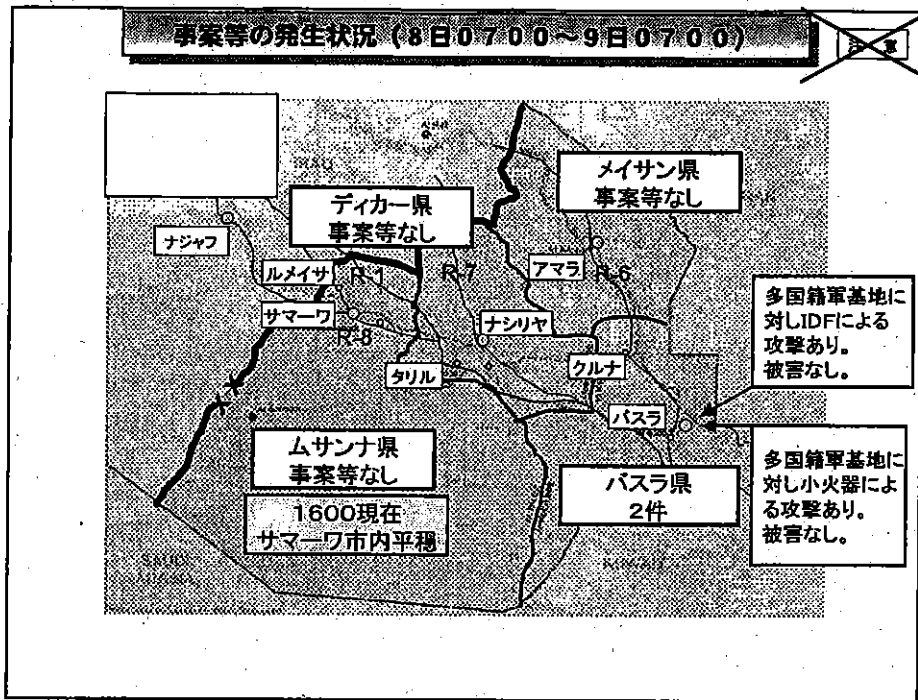

イラク全土の全般情勢評価 (10. 9)

区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> ●バグダッド中心に、中北・西部において多国籍軍及びイラク治安部隊に対する攻撃が継続 ●新政権発足後も攻撃件数は依然高い水準を維持 ●政治プロセスに関連し、テロ、衝突等が発生する可能性 ●南東部でサドル派が活動を活発化させている可能性 	8/26追加 8/8追加
スンニ派過激派	<ul style="list-style-type: none"> ●当面は現在のレベルでの活動(反多国籍軍・イラク治安機関・移行政府)を継続(急激な過激化への兆候はなし) ●アンサル・スンナとザルカウィGpが共闘の可能性 ●ザルカウィ関連Gpの活動が活発化 ●シーア・スンニ宗派間対立を企図したテロ発生の可能性 	9/15追加 9/1追加
FRE	●「反占領」を主眼に今後も脅威であり続ける	
国際テロリスト	●暴力と恐怖による方法(テロ)は今後も継続	
サドル派	●民心の掌握(ソフト路線)継続。一方で民兵再構築実施	
トレンド (特異事項)	●宗教行事等多数の人が集まる場を狙ったテロ(パニック誘引)	9/1追加



イラク南東部の全般情勢評価 (10.9)		
区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> ●比較的安定→アマラ、バスラで多国籍軍・イラク治安部隊等への攻撃発生 ●メイサン県に存在すると考えられていた即製爆弾攻撃ネットワークがバスラ県に活動を拡大した可能性 ●バスラの不安定な治安情勢が継続する可能性 	8/17追加 9/27追加 9/20追加
スンニ過激派 国際テロリスト FRE	<ul style="list-style-type: none"> ●多国籍軍が駐留する限り攻撃は継続 ●バスラ・メイサン県で即製爆弾増加傾向 	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ●サドル師の指示に従わない一部勢力の存在 ●バスラの状況が周辺地域のはねっかえりに影響を及ぼす可能性は否定できない。 	8/28追加 10/9追加
MSR・ASR	<ul style="list-style-type: none"> ●即製爆弾・車両爆弾、友軍相撃、ロードスパイク、子供飛出しカージャックがMSRタンパ、ASRサークル上で発生 ●ASRサークル路面状況悪化(タンパは開通予定延期) ●移動中のコンボイに対する車両爆弾の可能性 	7/23追加 7/22追加
タリルAB	<ul style="list-style-type: none"> ●空港への曲射撃及び離発着航空機に対する攻撃に警戒 	9/30追加
トレンド	南東部における電波指令式即製爆弾が増加	

ムサンナ県の全般情勢評価 (10.9)		
区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> ●比較的安定、しかしながら油断は出来ず ●知事、前評議会議長の動向等、政治情勢は依然流動的 ●イラク治安部隊の治安維持能力が向上しつつある。 	9/30修正 10/9追加
スンニ過激派 国際テロリスト	<ul style="list-style-type: none"> ●スンニ派テロリスト等が活動する可能性は低いが、県外からの流入、他地域での活動のための存在あり 	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ●サドル派が知事との対決姿勢をやめた可能性 ●バスラの影響により、はねっかえりが多国籍軍、イラク警察等に対する攻撃を行う可能性は否定できない。 	9/17追加 10/9追加
部族関連	宿营地警備等の雇用の増大を企図する一部の部族関係者が存在するとの情報	7/7追加
デモ関連	<ul style="list-style-type: none"> ●電気、水、ガソリン等の比較的良好な状況が継続し、気温も低下してきていることから、デモ発生の公算は低下していると考えられるが、雇用要求等のデモ発生の可能性はあり、知事辞任要求のデモ発生の可能性についても依然存続 	9/8修正

現地の気象情報

報告内容

日の出 : 0557
 日の入 : 1735
 月 齢 : 6.9
 月出没 : (没 9日2143~出10日1254)
 天 候 : 晴れ
 気 温 : 最高40.5 最低18.6℃
 : 最高46℃(直射日光下)
 湿 度 : 25.2%
 風 速 : NE 2~3m/s

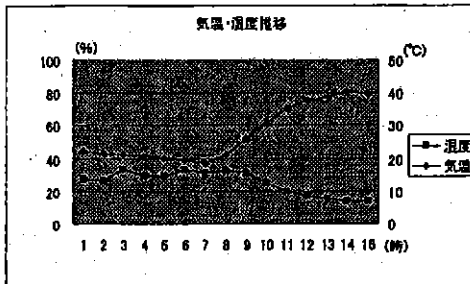

10月10日(月)の活動予定

コール	行動名	特 種	活動内容等	重 荷		
J1	科長の行動 J1:TFM随伴訪問	0630	0650	隊隊長報告		
		0655	0705	J71, J72, J101, J102, Jx1, Jx2行動指 導及び行動証明伏紙		
		0800	0810	群集札		
		0815	0830	作務会議		
		0830	0840	J任務域について(録音)		
		0850	0850	宿営地内動線		
		1030	1030	乗務者対応		
		1130	1300	週間活動見解指導		
		1330	1330	宿営地内動線		
		1520	1520	活動命令(第)伏紙		
		1530	1615	デイリーミーティング(J1, J103行動情報)		
		1645	1645	J1, J103行動証明伏紙		
		1635	別所	宿営地 見 キャンプ・スミッティ 着 キャンプ・スミッティ 見 宿営地 見	LAVO×3	
		1715	1745	電話会議(乗務者対応)		
		J2	業務支援隊長の行動		観力回復(~12日)	

10月10日(月)の活動予定

コード	行動名	時間	活動内容等	車両
J2 EXO	業務支援隊副隊長の行動 J2EXO:TFA相澤官訪問	0745	既朝礼	
		0800	既朝礼	
		0800	既朝礼	
		0810		
		0815	作戦会議	
		0830		
		0830	宿営地内勤務	
		1030		
		1030	来訪者対応	
		1130		
		1300	通商座船見送相導	
		1330		
		1330	宿営地内勤務	
		1800		
1815	デイリーミーティング			
1845				
	別示	宿営地 発 キャンプ・スミッティ 着 キャンプ・スミッティ 発 宿営地 着	J1に同乗	
J71	施設支援(ナイサー中学校施設工状況確認)	別示	ナイサー中学校 着(ヒワール) ナイサー中学校 発(ヒワール) 宿営地 着 宿営地 発	LAV(G)×4 高機(B)×1
J72	施設支援(ワルカ浄水場施設工状況確認)	別示	ワルカ浄水場 着(ワルカ) ワルカ浄水場 発(ワルカ) 宿営地 着 バスラ 発	LAV(G)×4 高機(B)×1
J9	POLAD会議からの移動	別示	宿営地 着	(ヘリ)

10月10日(月)の活動予定

コード	行動名	時間	活動内容等	車両
J101	ルートチェック			
J102	ルートチェック			
J103	ルートチェック J1先行			
Jx-1	射撃訓練(整備中隊)	別示	宿営地 発 射場 着(サマーフ) 射場 発(サマーフ) 宿営地 着	LAV(G)×5 大型(O)×1 中機(B)×1
Jx-2	射撃訓練(本管中隊)	別示	宿営地 発 射場 着(サマーフ) 射場 発(サマーフ) 宿営地 着	LAV(G)×3 高機(B)×6
J201	ORF(A)			
J202	ORF(B)			
