


イラク後送業務隊の活動報告



18. 8. 29
イラク後送業務隊

イラク後送業務隊活動報告 (8月29日)

1 人員・装備の状況

○ 人員・装備：異状なし

2 29日(火曜日)の活動

区分	業務内容
コンテナ作成	8月23日をもって終了 31
洗車	8月21日をもって終了
後送業務 本邦後送	○シュワイバ港からコンテナ船によるコンテナ113本(実86、空27)の後送(8月30日予定) ○シュワイク港からチャーター船によるコンテナ168本(実73、空95)及び車両85両の後送(9月5日予定) シュワイク港へ本邦後送車両34両及びコンテナ42本の搬入 倉庫における本邦後送車両32両の配列及び車両点検 ○ムバラク空港からチャーター機(アントノフ)によるWAPC7両等の後送(9月5日予定)
その他	○10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ○不用品廃棄に関する役務監督・検査 ○倉庫及びPWC洗浄施設の撤収業務
撤収・帰国業務	○使用施設の撤収準備(4名) ○RSU部隊隊貨の整理・梱包(52名) ○不用品等の集積・処分(2名) ○#3活動成果報告検討会(25名) ○別紙第1「RSU全般業務予定表」
その他	○別紙第2「RSU活動状況(8月29日)」

KWからの装備品等の後送状況把握 (全体像)

コンテナ

KWから本邦へ後送するコンテナ総数【477本】			
コンテナ詰め数【286本】		空数【191本】	
終了【286本】 (100%)			
後送済 【136本】		後送済 【60本】	

車両

KWから本邦へ後送する車両総数【224両】	
洗車終了【224両】 (100%)	
後送済 【132両】	

3 後送業務の進捗状況

8月29日末現在

区分	計画		実績 (c)	進捗度		残数	備考	
	総数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (c/a)	計画比 (c/b)			
コンテナ	開梱 (コンテナ数)	337	—	337 【0】	100%	—	0	
	コンテナ詰め (点数)	99,464	—	99,464 【0】	100%	—	0	
	後送 (点数)		46,748	46,748 【0】	47%	100%	52,716	
車両	洗浄	224	—	224 【0】	100%	—	0	
	後送		132	132 【0】	58.9%	100%	92	

※ 点数については、弾薬を除いた点数
【 】内は当日の実績で内数

4 30日(水曜日)の活動予定

区分		業務内容					
後送業務	コンテナ作成	8月23日をもって終了					
	洗車	8月21日をもって終了					
	本邦後送		時期	手段	発地	後送品	状況等
		1	8月30日	コンテナ船	シュワイバ港	コンテナ×113本 (実86、空27)	22日:40本搬入済み 23日:46本搬入済み
		2	9月5日	チャーター船	シュワイク港	コンテナ×168本 (実73、空95) 車両×85	搬入前日に██████に配列 29日:42本、34両搬入 30日:31本、32両搬入 31日:19両搬入
3	9月5日	チャーター機 (アントノフ)	ムバラク空港	WAPC×7	搬入待ち (通関書類等準備中)		
その他	○10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ○不用品処分に関する役務監督・検査 ○██████倉庫及びPWC洗淨施設の撤収業務						
撤収・帰国業務	○使用施設の撤収準備(4名) ○個人コンテナの検数・検量(44名) ○RSU部隊隊貨等の整理・梱包(52名) ○不用品等の集積・処分(2名)						
その他							

6 日々ミーティング

- 治安情勢:別紙第3「クウェートの治安状況等(8月29日)」
- RSU長指導事項
 - 昨日帰国行事、ご苦労様。縦・横の機能がよく連携・協力していたと思う。大使等も大変満足されていた。
 - 今後の活動において、気のゆるみ及び基礎動作の不履行による事故等の発生を防止するため、各級指揮官は、どうすればインセンティブを維持できるのかということに留意して指導してもらいたい。

RSU全般業務予定表


別紙第1

月	8月									9月											
	日	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8			
全般	コンテナ詰め終了	※車両洗浄は21日終了済み										#4コンテナ輸送 (113本)							民間貨物機 チャーター船発 コンテナ(168本) 車両(85両)	撤収作業終了	RSU出庫
後送業務	コンテナ輸送	シウワイバ搬入																	RSU出庫		
	貨物機輸送																RSU出庫				
	チャーター船輸送																RSU出庫				
	異動票等の作成	10次尉から補等への移動票作成(チャーター船分)															RSU出庫				
RSU撤収業務	使用施設の撤収	指図所・会議室・家族支援センター等															RSU出庫				
	レンタカーの返納																RSU出庫				
	部隊隊貨の梱包等	部隊隊貨ボール等(約350個)の梱包															RSU出庫				
	不用品等の集積・処分	#1処分(後送品)		処分		RSU分											#2処分(RSU分)	RSU出庫			
	衛生教育・帰国前教育	衛生教育に関する調整・海軍教育															RSU出庫				
	個人コンテナ・衣のう	私物品の整理・個人コンテナ等の作成															RSU出庫				
帰国行事等	帰国行事準備															RSU出庫					
活動成果報告作成	#2検討会															RSU出庫					
米軍・大使館等との調整	ムバク空海使用に関する調整															RSU出庫					
帰国便に関する調整	帰国チャーター機															RSU出庫					

凡例: ●は終了時期

RSU活動状況 (8月29日)

別紙第2

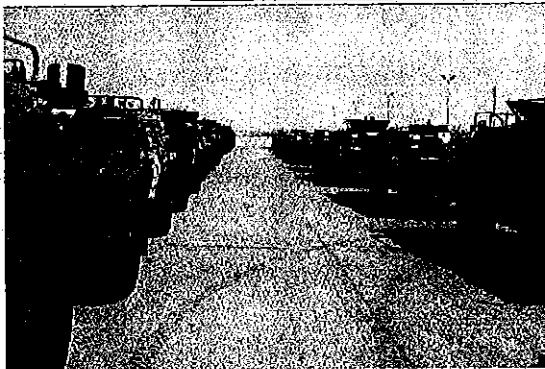

シウワイク港への本邦後送車両の搬入



倉庫における車両配列及び車両点検



28日帰国行事



#3活動成果報告検討会

クウェートの治安状況等 (8月29日)

区分	内容	備考
クウェートの治安状況等	<p>1 在クウェート日本大使館等 警戒情報</p> <p>(1) 警戒レベル : [REDACTED]</p> <p>(2) 日本国外務省渡航安全情報:クウェート全土「十分注意」(N/C)</p> <p>2 クウェート市内外の状況</p> <p>RSU宿泊場所等活動地域:異常なし。</p> <p>3 クウェート国内での車両運行に及ぼす影響</p> <p>交通事故は、ほぼ連日発生している事から車両運行時、特に次の点に注意</p> <p>(1) R6, R40上の速度超過による追突事故、突発的な歩行者の横断</p> <p>(2) 前方走行するトラックのバーストによるタイヤの飛来(7月以降は、道路の高温に加え、ほとんどのトラックは再生タイヤ着用のため、タイヤはバーストしやすい状況)</p> <p>(3) ロータリー交差点の進入・進出及び測道から本線への進入時</p> <p>4 宿泊場所等での活動に及ぼす影響</p> <p>クウェート全土で反米勢力がテロを敢行する可能性は排除できず、宿泊場所及び[REDACTED]倉庫等への移動間は警戒する必要がある。</p>	<p>N/C</p> <p>N/C</p> <p>N/C</p> <p>N/C</p>
気象	<p>1 天気:晴れ</p> <p>2 活動地域の温度 :最高・未測定 最低・未測定</p> <p>3 本日、夕方から徐々に風が強くなり、明日から31日にかけて砂が舞うと予想。その後は晴天の予想。</p> <p>(7/17アルサレム空軍基地 空自 気象班情報)</p>	<p>8/29確認</p>
