



イラク後送業務隊の活動報告



18. 8. 3
イラク後送業務隊

イラク後送業務隊活動報告 (8月3日)

1. 人員・装備の状況

○ 人員・装備：異状なし

2. 3日(木曜日)の活動

区分		業務内容
後送業務	コンテナ作成	6個コンテナ作成 (車両×5、施設×1)
	洗車	7両後送準備終了 (大型×7)
	本邦後送	○シュワイク港から専用船による車両65両の後送(8月11日予定)
	その他	○10次群長から補給への物品の異動に伴う証書の作成 ○ファルアニア倉庫の物品の移送(→ 倉庫)
その他	○別紙第1「RSU活動状況(8月3日)」	

(空手) 18.8.3
 ○ 8月 9.9: 12:30 まで
 車庫の掃除. 18.8.312/5.8.12/2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31

(11/100P)
 18.8.312/5.8.12/2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31

18.8.312/5.8.12/2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31

8月3日現在

KWからの装備品等の後送状況把握（全体像）

コンテナ

KWから本邦へ後送するコンテナ総数【581本】			
コンテナ詰め数【225本】		空数【356本】	
終了【145本】 (64.4%)	今後実施【80本】		
後送済【76本】		後送済【50本】	

車両

KWから本邦へ後送する車両総数【225両】	
洗車終了【148両】 (68.2%)	今後実施【77両】
後送済【27両】	

③ 後送業務の進捗状況

8月3日末現在

区分	計画		実績 (c)	進捗度		残数	備考	
	総数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (c/a)	計画比 (c/b)			
コンテナ	開梱 (コンテナ数)	337	311	315 【12】	93.5%	101.3%	22	
	コンテナ詰 (点数)	99,464	40,123	40,629 【3,628】	40.8%	101.3%	58,835	
	後送 (点数)		16,635	16,635 【0】	16.7%	100%	82,829	
車両	洗浄	225	121	148 【7】	68.2%	119%	77	
	後送		27	27 【0】	11.3%	100%	198	

※ 点数については、弾薬を除いた点数
【 】内は当日の実績で内数

4 4日(金曜日)の活動予定

区分	業務内容
後送業務	コンテナ作成 6個コンテナ作成 (車両×5、火器×1)
	洗車 3両後送準備完了 (高機動車×1、大型×2)
	本邦後送 ○シュワイク港から専用船による車両65両の後送(8月11日予定)
	その他 ○10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成
その他	○ 倉庫及びPWC洗浄施設において高官対応(1515~1615)

5 週間後送計画及び実績

区分	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4
	土	日	月	火	水	木	金
コンテナ作成	車両×2 通電×1 火器×1 施設×1 化学×1	車両×2 通信×1 需品×3	車両×1 通信×1 需品×2 施設×2	通信×1 →2 衛生×1 需品×1 施設×1	車両×3 →4 通信×1 需品×2 衛生×1 施設×2	車両×3 →5 通信×3 施設×1	⊖ 車両×5 火器×1
	車両×2 通電×1 火器×1 施設×1 化学×1	車両×2 通信×1 需品×3	車両×1 通信×1 需品×2 施設×2	通信×2 施設×1	車両×5 施設×2 衛生×1 需品×3	車両×5 施設×1	
洗車	6	6	6	2→3	6	6	0→3
	6	6	11	6	9	7	
後送	コンテナ(空)	20(50) 計70		20(50) 計70			
	トレーラ						
	車両						

※下段には実績を記入

6 日々ミーティング


○ 治安情勢:別紙第2「クウェートの治安状況等(8月3日)」

○ RSU長指導事項

- 今朝、統幕長から電話を頂き、「①新たな気持ちで任務を遂行せよ。」②事故を起こさないよう留意せよ。」とお言葉を頂戴した。RSUとしては、「基本に立ち返り、また、派遣当初の初心を忘れず任務遂行に邁進する。」「交通事故、サービス事故等、各種事故を起こさない。」という気持ちで業務を実施してもらいたい。
- 急遽、大使館からの依頼で麻生外務大臣がRSUを視察されることになった。明日の整備日は取りやめとし、恒常業務を実施して対応する。また、短い時間ではあるが最大限準備し、我々の活動をしっかり見てもらえるように実施せよ。

別紙第1


RSU活動状況 (8月3日)

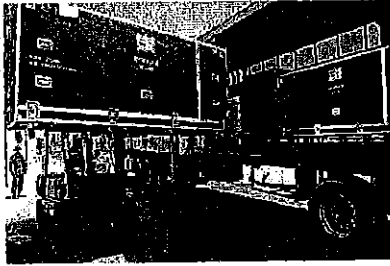

ファルアニア倉庫から[]倉庫への物品の移送
(10次群用追送部品等)



[]倉庫において車両からお守りの取り外し

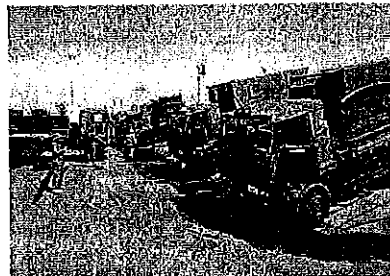

PWC洗浄施設における車両の1次洗浄

クウェートの治安状況等 (8月3日)

別紙第2

区分	内容	備考
クウェートの治安状況等	1 在クウェート日本大使館等 警戒情報 (1) 警戒レベル : ██████████ (2) 日本国外務省渡航安全情報:クウェート全土「十分注意」(N/C) 2 クウェート市内外の状況 ██████倉庫・RSU宿泊場所等活動地域:異常なし。 3 クウェート国内での車両運行に及ぼす影響 交通事故は、ほぼ連日発生している事から車両運行時、特に次の点に注意 (1) R6, R40, R80上の速度超過による追突事故、突発的な歩行者の横断 (2) 前方走行するトラックのバーストによるタイヤの飛来(7月以降は、道路の高温に加え、ほとんどのトラックは再生タイヤ着用のため、タイヤはバーストしやすい状況) (3) ロータリー交差点の進入・進出及び側道から本線への進入時 (4) 砂塵及び砂嵐発生時、視界不良。安全速度の厳守 4 宿泊場所及び█████倉庫等での活動に及ぼす影響 クウェート全土で反米勢力がテロを敢行する可能性は排除できず、宿泊場所及び█████倉庫等への移動時は警戒する必要がある。	N/C N/C N/C N/C
	1 天気:晴れ、砂塵 2 活動地域の温度(PWC洗車場) :最高・・48℃(昨日比±0℃) 最低・・42℃(昨日比±0℃) 3 明日も砂塵が発生 明日は本日と同様に砂塵が発生。5日は少し砂塵が残る可能性有り。その後晴天が続き、9日再び砂塵が発生すると予想。 (7/17Lサレム空軍基地 空白 気象班情報)	8/3更新
