




# イラク後送業務隊の活動報告



18. 8. 8  
イラク後送業務隊

## イラク後送業務隊活動報告 (8月8日)

### 人員・装備の状況

○ 人員：クウェート後送隊 [redacted] 帰国 ([redacted] のため)  
装備：異状なし

### 28日(火曜日)の活動

区分	業務内容
コンテナ作成	4個コンテナ作成 (車両×2、通信×2)
洗車	6両後送準備終了 (LAV×4、特大型×1、冷凍冷蔵車×1)
後送業務 本邦後送	○シュワイク港から専用船による車両65両の後送(8月11日予定) 6日～9日:車両のシュワイク港への搬入 6日～11日:通関のための処置 9日～10日:専用船への車両の積載 ○シュワイバ港からコンテナ船によるコンテナ70本(実60、空10)の後送(8月13日予定)
その他	○10次隊長から補給への物品の異動に伴う証書の作成 ○不用品処分ための仕様書等作成及び処分準備(10日契約予定)
その他	○特備部長視察受け(6日～8日) ○別紙第11RSU活動状況(8月8日)

8月8日現在

**KWからの装備品等の後送状況把握(全体像)**

**コンテナ**

KWから本邦へ後送するコンテナ総数【581本】			
コンテナ詰め数【233本】		空数【348本】	
終了【169本】 (72.5%)	【64本】		
後送済【76本】		後送済【50本】	

**車両**

KWから本邦へ後送する車両総数【224両】	
洗車終了【165両】 (73.7%)	【59両】
後送済【27両】	

**後送業務の進捗状況**

8月8日未現在

区分	計画		実績 (c)	進捗度		残数	備考
	総数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (c/a)	計画比 (c/b)		
コンテナ	開梱 (コンテナ数)	337	337 [0]	100%	100%	0	
	コンテナ詰め (点数)	99,464	47,127 [888]	47.4%	100.6%	52,340	
	後送 (点数)		16,635 [0]	16.7%	100%	82,829	
車両	洗車	224	165 [6]	73.7%	119.6%	59	
	後送		27 [0]	11.3%	100%	197	

※ 点数については、弾薬を除いた点数  
【 】内は当日の実績で内数

9日(水曜日)の活動予定	
区分	業務内容
後送業務	<b>コンテナ作成</b> 10個コンテナ作成 (車両×2、通信×1、需品×6、施設×1)
	<b>洗車</b> 9両後送準備完了 (LAV×9)
	<b>本邦後送</b> ○シュワイク港から専用船による車両65両の後送(8月11日予定) 6日～9日:車両のシュワイク港への搬入 6日～11日:通関のための処置 9日～10日:専用船への車両の積載 ○シュワイバ港からコンテナ船によるコンテナ70本(実60、空10)の後送(8月13日予定)
	<b>その他</b> ○10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ○不用品処分ための準備(10日契約予定)
その他	

5週間後送計画及び実績							
区分	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11
	土	日	月	火	水	木	金
コンテナ作成	0	車両×4 需品×3	車両×3 需品×2 施設×2	車両×2 通信×2	需品×3 →6 車両×2 通信×1 施設×1	車両×2	0
	0	車両×4 需品×3	車両×3 需品×2 施設×2	車両×2 通信×2			
洗車	0	4	3→6	2→4	5→9	5	0
	0	8	7	6			
後送	コンテナ						
	トレー						
	車両						65

※下段には実績を記入


6. 日誌

- 治安情勢: 別紙「クウェートの治安状況等(8月8日)」
- RSU長指導事項
  - 一 装備部長の視察受けお疲れ様。今後は、後送業務を実施しつつ、施設等の撤収やチャーター機の調整等、自らの帰国のための業務について並行的に実施せよ。

RSU活動状況 (8月7日)

別紙第1

装備部長視察受け




PWC 7101 (0900-1145)

CPLCC 1151 (1300-1700)



シュワイク港への車両の搬入

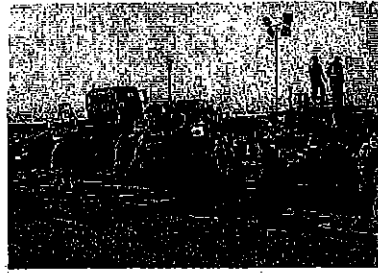

PWC洗淨施設における1次洗淨

クウェートの治安状況等 (8月8日)		別紙第2
区分	内容	備考
クウェートの治安状況等	1 在クウェート日本大使館等 警戒情報 (1) 警戒レベル : ██████████ (2) 日本国外務省旅航安全情報:クウェート全土「十分注意」(N/C)	N/C
	2 クウェート市内外の状況 ████████ 倉庫・RSU宿泊場所等活動地域:異常なし。	N/C
	3 クウェート国内での車両運行に及ぼす影響 交通事故は、ほぼ連日発生している事から車両運行時、特に次の点に注意 (1) R6, R40, R80上の速度超過による追突事故、突発的な歩行者の横断 (2) 前方走行するトラックのバーストによるタイヤの飛来(7月以降は、道路の高温に加え、ほとんどのトラックは再生タイヤ着用のため、タイヤはバーストしやすい状況) (3) ロータリー交差点の進入・進出及び測道から本線への進入時 (4) 砂塵及び砂嵐発生時、視界不良、安全速度の厳守	N/C
	4 宿泊場所及び ██████████ 倉庫等での活動に及ぼす影響 クウェート全土で反米勢力がテロを敢行する可能性は排除できず、宿泊場所及び ██████████ 倉庫等への移動時は警戒する必要がある。	N/C
	5 その他 「ロシア政府が指摘したクウェートのテロ組織について」	8/8追加
気象	1 天気:晴れ 2 活動地域の温度(PWC洗車場) :最高・51°C(昨日比+2°C) 最低・44°C(昨日比+3°C) 3 今後、安定した天候が続く 今後、当面の間、安定した天候が続く。8日頃に若干風が強まるものの砂塵が発生するほどではないと予想。 (717ルサム空軍基地・空自 気象班情報)	8/8更新

ロシア政府が指摘したクウェートのテロ組織について(1/2)	付紙
<p><b>【趣旨】</b> ARAB TIMES (7/29付) にロシアが公表した17のテロリストグループのリスト (ロシア新聞に掲載されたのを転載したもの) に二つのクウェート人組織が載ったところ、これについて情報収集した事について紹介するもの <b>【記事の概要の骨子】</b> (7/29付アラブタイムズ)</p> <p>1 ロシア政府としてテロ組織と認識している17のテロ組織: 属紙参照 2 クウェートのテロ組織 No13 The Society of Social Reforms (Jamiat al-Islah al-Ijtimal) No14 The Society of the Revival of Islamic Heritage (Jamiat Ihya at-Turaz al-Islami)</p> <p>3 国際テロリズムとの戦いを担当するロシア連邦治安機関高官の話 「ハマスやヒズボラはロシアにとって主要な脅威ではない、また世界的にはそれらはテロリスト組織としては認識されていない。」</p> <p>4 17組織のリストは、ロシアの安全に特に脅威となる組織を指摘しているもの <b>【ロシアに指摘されたクウェートのテロ組織の実態】</b> (情報源:クウェート内務省)</p> <p>1 表向きは慈善事業を展開している組織であり、現時点で武器等を所持している情報なし。 2 これまで表だった活動なし。</p> <p><b>【現時点の不明事項】</b> クウェートの2つのテロ組織の細部概要 (構成人員数・ロシア政府が脅威と認識している背景 (チェックン武装勢力の関心の有無))</p>	

ロシア政府が指摘したクウェートのテロ組織について(2/2)

- 【ロシア政府が認識しているテロ組織】(7/29付アラブタイムス)
- 1 The highest military Majlisul Shura of the united forces of the mujahedeen of the Caucasus.
  - 2 The Congress of the Peoples of Ichkeria and Daghestan.
  - 3 AL-Qaeda 2
  - 4 Asbat al-Ansar
  - 5 The holy war (Al-Jihad or the Egyptian Islamic Jihad)
  - 6 The Islamic group (Al-Jamaa al-Islami)
  - 7 The Muslim Brotherhood (Al-Ikhvan al-Muslimun)
  - 8 The party of Islamic liberation (Hizbut-Tahrir al-Islami)
  - 9 Lashkar-e-Toiba (LeT)
  - 10 The Islamic group (Jamaat-e-Islami)
  - 11 The Taleban movement
  - 12 The Islamic Party of Turkestan (former Islamic Movement of Uzbekistan)
  - 13 The Society of Social Reforms (Jamiat al-Islah al-Utimal)
  - 14 The Society of the Revival of Islamic Heritage (Jamiat Ihya at-Turaz al-Islami)
  - 15 The house of the two holy (Al-Haramain)
  - 16 Junj ash-Sham (Army of the Great Syria)
  - 17 The Islamic Jihad-jamaat of the mujahedeen
- 【現時点での評価】  
現時点では、RSUの活動に与える影響・脅威は極めて少ないと見料。(クウェート内務省の情報及びロシア政府筋(アラブタイムスの記事)より)

陸自イラ特部隊の活動実績等と活動予定

	8日(火)の活動実績等	9日(水)の活動予定
陸自イラ特部隊	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 後送業務                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 倉庫におけるコンテナの開梱、コンテナ詰め</li> <li>・ PWC洗浄施設における後送車両の点検及び洗車</li> <li>・ 8月11日後送車両のシュワイク港への搬入</li> <li>・ 10次隊長から補統への物品の異動に伴う証書の作成</li> <li>・ 不用品処分ための仕様書等作成及び処分準備</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 後送業務                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 倉庫におけるコンテナの開梱、コンテナ詰め</li> <li>・ PWC洗浄施設における後送車両の点検及び洗車</li> <li>・ 8月11日後送車両のシュワイク港への搬入</li> <li>・ 10次隊長から補統への物品の異動に伴う証書の作成</li> <li>・ 不用品処分ための準備</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ その他                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 装備部長視察受け(8日~8日)</li> </ul> </li> </ul>	
